ANEXO II.2
PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO (P.G.P.)

Activity ID	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late start	Late finish	Total float
INGENIERIA Y DISEÑO						
CIVIL, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA						
+ ADJUDICACION						
	0	30MAR98	29MAR98	30MAR98	29MAR98	0
+ PROYECTO BASICO						
	2	30MAR98	12APR98	30MAR98	12APR98	0
PROYECTO CONSTRUCTIVO OBRAS CIVILES						
+ - PROYECTO						
	7	13APR98	31MAY98	13APR98	31MAY98	0
+ - LINEAS DE COMBUSTIBLE						
	4	13APR98	10MAY98	13APR98	31MAY98	3
+ - ESTACION DE BOMBEO Y DEPURACIÓN						
	3	11MAY98	31MAY98	11MAY98	31MAY98	0
+ - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMBUSTIBLE						
	5	20APR98	24MAY98	27APR98	31MAY98	1
+ - INSTALACIÓN DE P.C.I.						
	5	20APR98	24MAY98	27APR98	31MAY98	1
+ - EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL						
	4	13APR98	10MAY98	20APR98	31MAY98	3
INSTALACIONES ELECTRO MECANICAS						
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES						
+ - PROYECTO						
	8	13APR98	07JUN98	13APR98	07JUN98	0
+ - LINEAS DE COMBUSTIBLE						
	6	20APR98	31MAY98	20APR98	07JUN98	1
+ - ESTACION DE BOMBEO Y DEPURACIÓN						
	6	27APR98	07JUN98	27APR98	07JUN98	0
+ - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMBUSTIBLE						
	8	13APR98	07JUN98	20APR98	07JUN98	0
+ - INSTALACION DE P.C.I.						

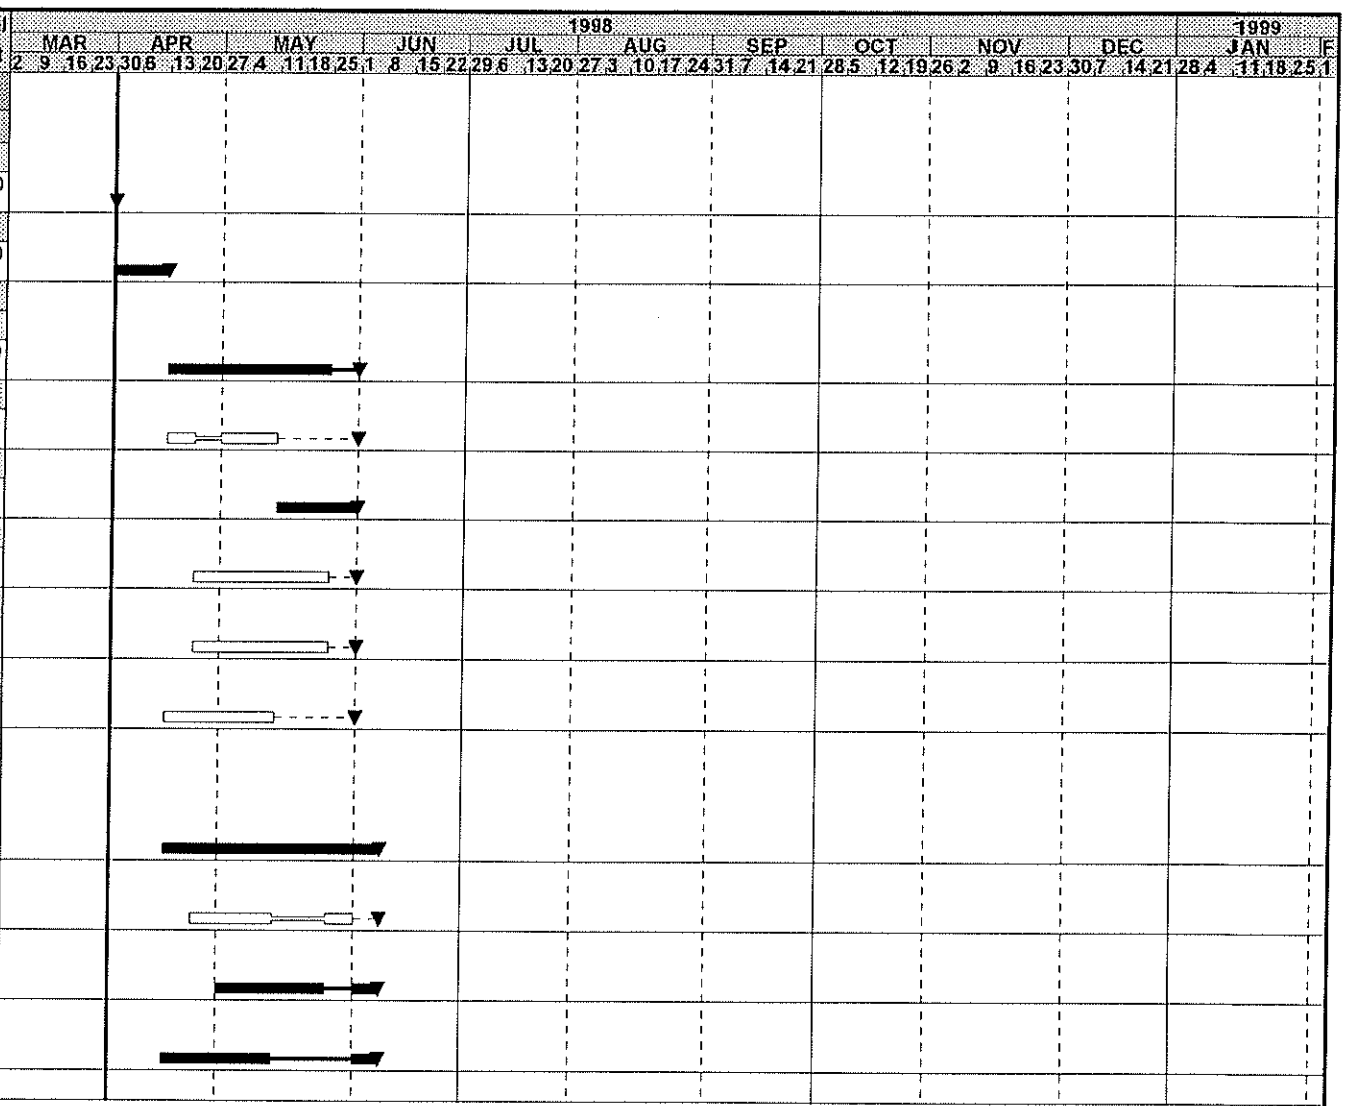

Project Start	30MAR98
Project Finish	08NOV98
Data Date	30MAR98
Plot Date	26JUN98

Early Bar
Float Bar
Progress Bar
Critical Activity

©Primavera Systems, Inc.

INTECSA UHDE INDUSTRIAL, S.A.
PROYECTO EJEMPLO
PROGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

Sheet 1 of 3

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Date	Revision	Checked	Approved

Activity ID	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late start	Late finish	Total float
	7	13APR98	31MAY98	20APR98	07JUN98	1
+ - EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL						
	6	27APR98	07JUN98	04MAY98	07JUN98	0
+ - PROTECCIÓN CATÓDICA						
	6	27APR98	07JUN98	04MAY98	07JUN98	0
GESTION DE COMPRAS						
COMPRAS EQUIPOS Y MATERIALES						
+ - LINEAS DE COMBUSTIBLE						
	18	20APR98	23AUG98	20APR98	23AUG98	0
+ - ESTACION DE BOMBEO Y DEPURACIÓN						
	20	27APR98	13SEP98	27APR98	13SEP98	0
+ - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMBUSTIBLE						
	12	27APR98	19JUL98	27APR98	19JUL98	0
+ - INSTALACION DE P.C.I.						
	11	27APR98	12JUL98	04MAY98	19JUL98	1
+ - EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL						
	8	27APR98	21JUN98	27APR98	21JUN98	0
+ - PROTECCIÓN CATÓDICA						
	10	27APR98	05JUL98	27APR98	05JUL98	0
CONSTRUCCION						
OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA						
+ - GENERAL						
	22	08JUN98	08NOV98	15JUN98	08NOV98	0
+ - LINEAS DE COMBUSTIBLE						
	21	15JUN98	08NOV98	22JUN98	08NOV98	0
+ - ESTACION DE BOMBEO Y DEPURACIÓN						
	4	15JUN98	12JUL98	24AUG98	20SEP98	10
+ - CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMBUSTIBLE						
	15	15JUN98	27SEP98	29JUN98	08NOV98	6
+ - INSTALACION DE P.C.I.						
	3	15JUN98	05JUL98	03AUG98	23AUG98	7

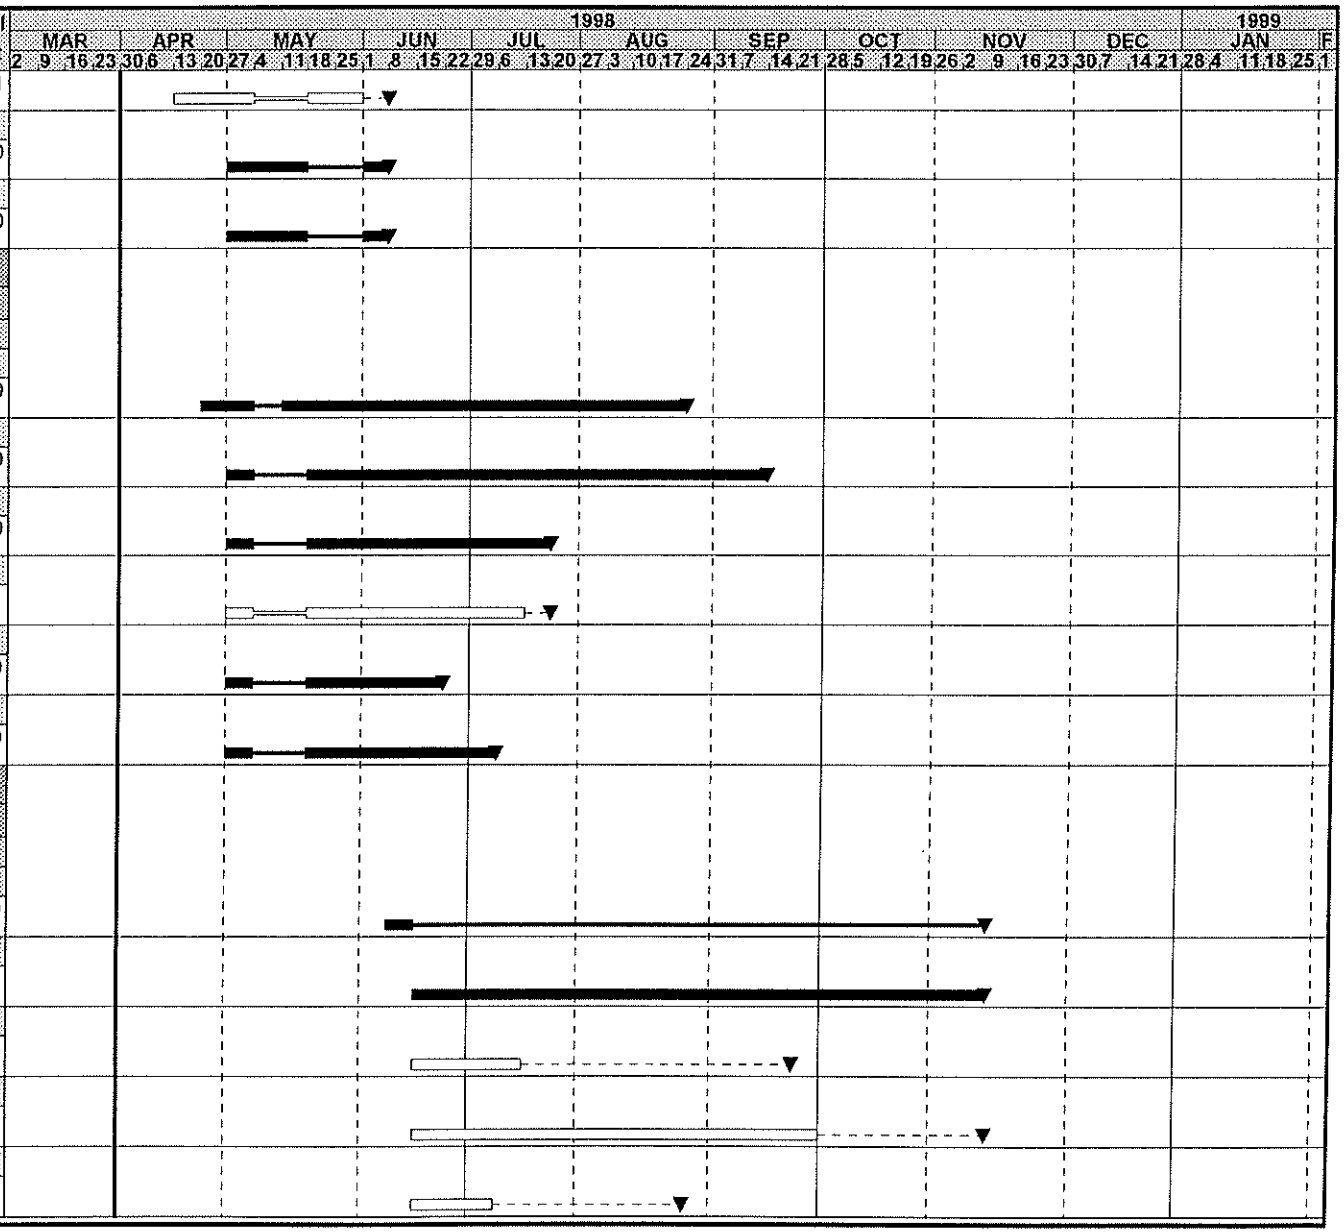
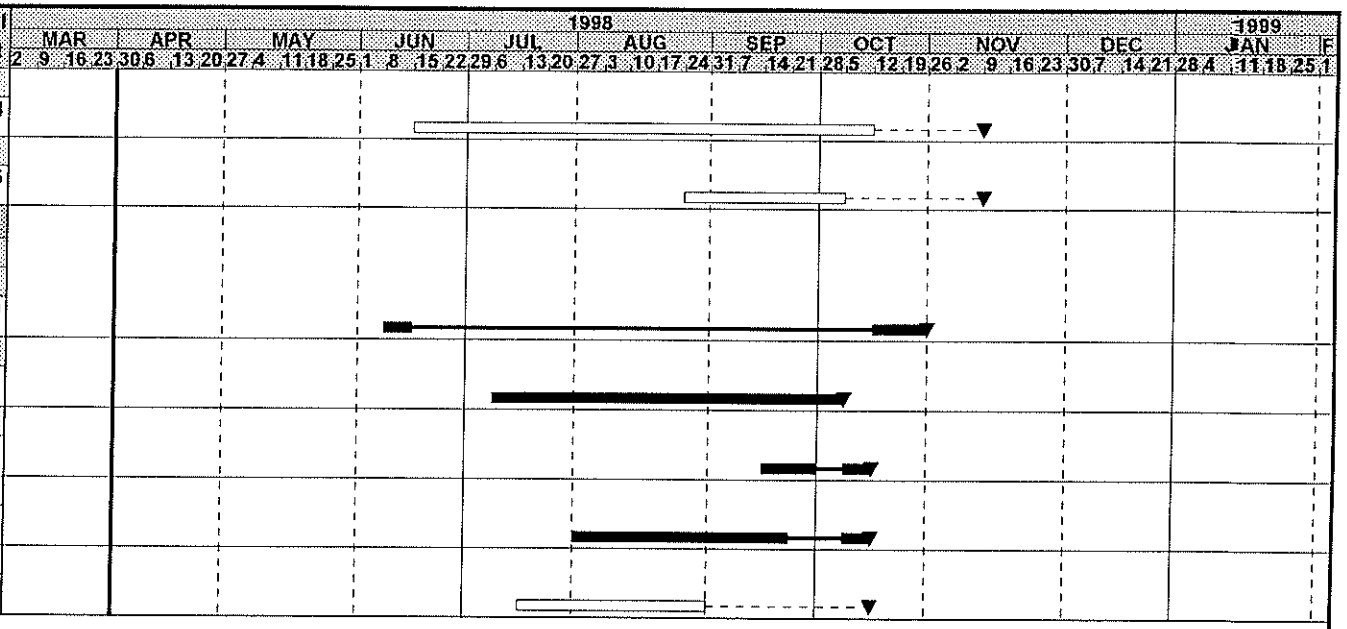
Activity ID	Orig Dur	Early Start	Early Finish	Late start	Late finish	Total float
+ - EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL						
	17	15JUN98	11OCT98	13JUL98	08NOV98	4
+ - REDES DRENAJE Y URBANIZACION						
	6	24AUG98	04OCT98	28SEP98	08NOV98	5
MONTAJE ELECTRO MECANICO						
+ - GENERAL						
	20	08JUN98	25OCT98	29JUN98	25OCT98	0
+ - LINEAS DE COMBUSTIBLE						
	13	06JUL98	04OCT98	06JUL98	04OCT98	0
+ - ESTACION DE BOMBEO Y DEPURACION						
	4	14SEP98	11OCT98	21SEP98	11OCT98	0
+ - CENTRO DE DISTRIBUCION COMBUSTIBLE						
	11	27JUL98	11OCT98	10AUG98	11OCT98	0
+ - INSTALACION DE P.C.I.						
	7	13JUL98	30AUG98	24AUG98	11OCT98	6
