INSTRUCCIONES DE APROBACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE IUI PARA EL PROYECTO 14113 – CEPSA HDS V

ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE
2. APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS
3. DEFINICIONES DE INTERÉS
4. CIRCUITO DE APROBACIÓN O WORKFLOW DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 14113 – CEPSA HDS V
5. INSTRUCCIONES
   - ANEXO 1. Auditoría
   - ANEXO 2. Propiedades del documento

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
	JJDP	01	23/07/2002	PARA APROBACIÓN Y/O COMENTARIOS

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento tiene por objeto describir el procedimiento de **introducción**, **aprobación** y **distribución de documentos en el portal de IUI para el proyecto 14113 – CEPSA Hidrodesulfuración V**.

2. APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

El Portal de IUI permite establecer **circuitos de aprobación (workflows)** mediante los cuales se hacen llegar los documentos a aquellos destinatarios que deban verificarlos o aprobarlos. **Cada acción de aprobación o rechazo exige la introducción de la contraseña del usuario y queda registrada en el sistema.**

Mediante la aprobación electrónica de los documentos se persiguen los siguientes objetivos:

- **Control del estado y del proceso de aprobación de los documentos**: para cada documento siempre será posible conocer en qué estado se encuentra, es decir, si aún no está aprobado, si está aprobado por IUI, si ya ha sido revisado por el cliente, etc. Asimismo, las acciones de aprobación o rechazo quedan registradas en el sistema.
- **Integridad de la información:** una vez aprobado un documento no será posible borrarlo o sobrescribirlo pero sí introducir una nueva edición conservando las anteriores. Ello posibilita a su vez establecer permisos sobre el documento que permitan escribir a varios usuarios y por tanto la actualización de las nuevas ediciones por cualquiera de ellos.
- **Disponibilidad inmediata de la información**: el documento es introducido previamente a su aprobación con lo que cuando ésta se produce la distribución de los documentos y el acceso a los mismos son inmediatos.

MUY IMPORTANTE: dado que la aprobación electrónica está asociada a la introducción de la contraseña del usuario, es esencial que cada usuario sea el único que conozca su contraseña, no debiendo darla a conocer a ningún otro.

3. DEFINICIONES DE INTERÉS

CICLO DE VIDA:

Sucesión de estados por los que pasa un documento desde que es iniciado su circuito de aprobación hasta que éste concluye. En el caso de documentos de proyecto, en el caso general dicha sucesión de estados es la siguiente:

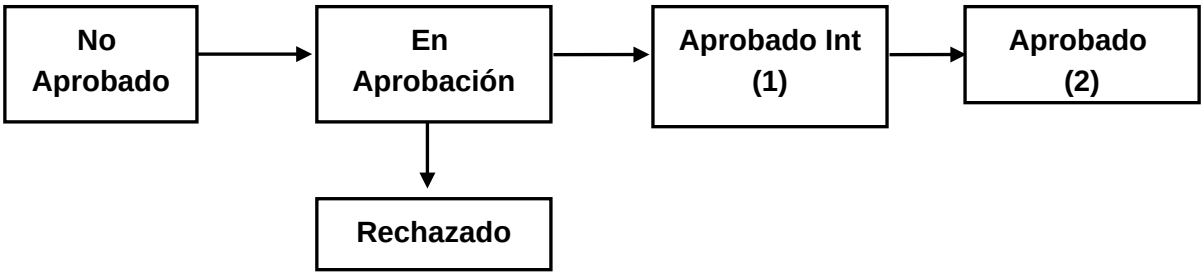

(1) Indica aprobación interna (por IUI).

(2) Indica que el documento se considera a todos los efectos APROBADO, tanto para la Ingeniería (IUI) como para el cliente.

WORKFLOW:

Proceso mediante el que se hace llegar un documento a una serie de destinatarios a través del Portal de IUI (se puede decir que es un circuito de distribución-aprobación que se aplica a los documentos).

Los participantes en el workflow pueden abrir el documento, revisarlo y si así se les requiere aprobarlo o rechazarlo, acción ésta última que exige la introducción de la contraseña del usuario.

Todas las acciones de aprobación o rechazo del documento quedan registradas en el sistema, registro que constituye la auditoria de dicho documento.

TAREA ( ):

Un documento sobre el que se ha aplicado un workflow va llegando sucesivamente a los destinatarios que se determinen bajo la forma de **tarea**, que consiste en un **mensaje que lleva adjuntos el documento y las notas enviadas por los participantes anteriores en el workflow. Cada usuario dispone de un buzón personal de tareas en el Portal** a través del cual recibe las tareas y las notificaciones.

NOTIFICACIÓN (✍):

Mensaje a través del cual se comunica alguna incidencia ocurrida en un workflow, como pudiera ser la retención de un documento sin aprobar o rechazar durante más tiempo del prefijado. Las notificaciones **son recibidas por cada usuario en su buzón personal de Tareas.**

AUDITORÍA:

Registro asociado a cada documento que **recoge aquellos atributos más significativos** del documento (**nombre, edición, fecha, editado para, etc**.) **y las acciones de aprobación o rechazo** que han realizado los participantes en el circuito de aprobación (workflow), quién las ha realizado y en qué fecha. **Es donde queda constancia de quiénes y cuándo han aprobado o rechazado el documento.** **(Ver ANEXO 1.)**

Para acceder a este registro existe una diferencia si se accede desde la **intranet de IUI** en la que la encontramos anexa al documento o bien el acceso como **proyecto en colaboración** por parte del **cliente** que tendrá la posibilidad de conocer el último paso accediendo a la auditoria a través de las propiedades del documento.

4. CIRCUITO DE APROBACIÓN O WORKFLOW DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 14113 – HDS V. (Ver Figura Adjunta)

Se empleará un único workflow (circuito de aprobación) para todos documentos que requieran aprobación, recogiéndose en él todas las opciones necesarias para cubrir los distintos casos.

Dicho workflow (circuito de aprobación) **será siempre iniciado por el Responsable de Cuenta correspondiente, siendo éste el único con opción a ello**.

A partir de aquí, **se recorre el circuito completo** (ingeniero de proyecto, jefe de proyecto, etc.) si bien **la aprobación por parte del cliente es registrada a través del Administrador de Proyecto.**

Una vez el documento es **aprobado en IUI (APROBADO INT.)** se le da **acceso al cliente** para que pueda visualizarlo **a través del portal de internet de IUI** para proyectos en colaboración.

Adicionalmente durante el curso del workflow o circuito de aprobación, en algunos de sus pasos **existe la opción para el ingeniero de proyecto y para el jefe de proyecto de decidir si el documento se publica o no para que pueda ser accesible a los proveedores a través del Centro de Negocios.**

Al margen del workflow, el Administrador de Proyecto podrá en todo momento publicar los documentos o hacer que documentos que hasta ese momento eran públicos para los proveedores dejen de serlo.

En el caso general, **la opción de publicar se aplicará a documentos emitidos para petición de oferta y para planos aún no emitidos para construcción** mientras que para documentos de índole contractual (RMs para compras, planos para construcción, etc.) no serán publicados hasta que sean aprobados por el cliente.

PASOS DE LOS QUE CONSTA EL WORKFLOW

En cuanto el Responsable de Cuenta inicia el workflow el documento llega como tarea al **Ingeniero de Proyecto** quien podrá optar por:

- **verificar** el documento y enviárselo al **Jefe de Proyecto** para su posterior aprobación (opción "***Verificar IP y Enviar JP***")
- **aprobar** el documento directamente (opción "***Aprobar IP***"): el documento queda **aprobado por IUI** (pasa al estado **APROBADO INT**) y pasa al **Administrador de Proyecto.**
- **aprobar y publicar en el Centro de Negocios** (opción **"*Aprobar y publicar IP*")**: el documento también queda **aprobado por IUI** (estado **APROBADO INT**) y pasa al **Administrador de Proyecto** pero además permite que el documento sea inmediatamente accesible para los proveedores vía Internet a través del **Centro de Negocios de IUI.**

- **rechazar** el documento (opción "***Rechazar IP"***): el documento sale del circuito de aprobación de modo que llega una tarea al **Responsable de Cuenta** para finalizar el **workflow,** quedando así enterado del rechazo del documento**.**

El siguiente responsable de aprobación es el **Jefe de Proyecto** que tiene unas opciones similares al **Ingeniero de Proyecto**:

- **aprobar** (opción "***Aprobar JP"***): el documento queda **aprobado por IUI** (estado **APROBADO INT**) y pasa al **Administrador de Proyecto.**
- **aprobar y publicar** (opción "***Aprobar y publicar JP"***)*:* el documento también queda **aprobado por IUI** (estado **APROBADO INT**) y pasa al **Administrador de Proyecto** pero además permite que el documento sea inmediatamente accesible para los proveedores vía Internet a través del **Centro de Negocios de IUI.**
- **rechazar** (opción ***"Rechazar JP***"): el documento sale del circuito de aprobación de modo que llega una tarea al **Responsable de Cuenta** para finalizar el **workflow,** quedando así enterado del rechazo del documento**.** Además, le llega una notificación al **Ingeniero de Proyecto** que antes revisó el mismo.

Después le llegará la tarea al **Administrador del Proyecto** que se encargará, si fuera necesario, de hacer llegar el documento al cliente para su aprobación final y esperará a recibir de nuevo el documento por parte del **cliente** y registrar el **estado final** del mismo (aprobado con comentarios, sin comentarios o rechazado) así como también tiene la posibilidad de decidir en este punto si se **publica**, es decir, hacer o no visible el documento a los proveedores a través de **Centro de Negocios**.

Así, dispondrá de las siguientes opciones:

- **indicar** que el documento **no requiere la aprobación del cliente** (opción "***No requiere aprob cliente"***): el documento queda a todos los efectos **aprobado** (estado **APROBADO**)**.**
- **Registrar** que el documento ha sido **aprobado sin comentarios por el cliente** (opción "***ASC"***)*:* el documento queda **aprobado** (estado **APROBADO**) y el atributo "**Revisado por cliente"** pasa a indicar **Aprobado SC**.
- **Registrar** que el documento ha sido **aprobado con comentarios por el cliente** (opción "***ACC"***)*:* el documento queda **aprobado** (estado **APROBADO**) y el atributo "**Revisado por cliente"** pasa a indicar **Aprobado CC**.

IMPORTANTE: los comentarios del cliente no estarán reflejados en el contenido del documento en el Portal.

- **Registrar** que el documento ha sido **rechazado por el cliente** (opción "***Rechazado"***): el documento permanece como **aprobado por IUI** (estado **APROBADO INT**) pero el atributo "**Revisado por cliente"** pasa a indicar **Rechazado cliente**.

Independientemente de la opción elegida, el documento llegará al **Responsable de Cuenta** con la situación exacta en la que ha quedado el mismo tras el paso por el circuito de aprobación y finalizará el **workflow.**

FIGURA 1: CUADRO RESUMEN DEL PROCESO DE APROBACIÓN

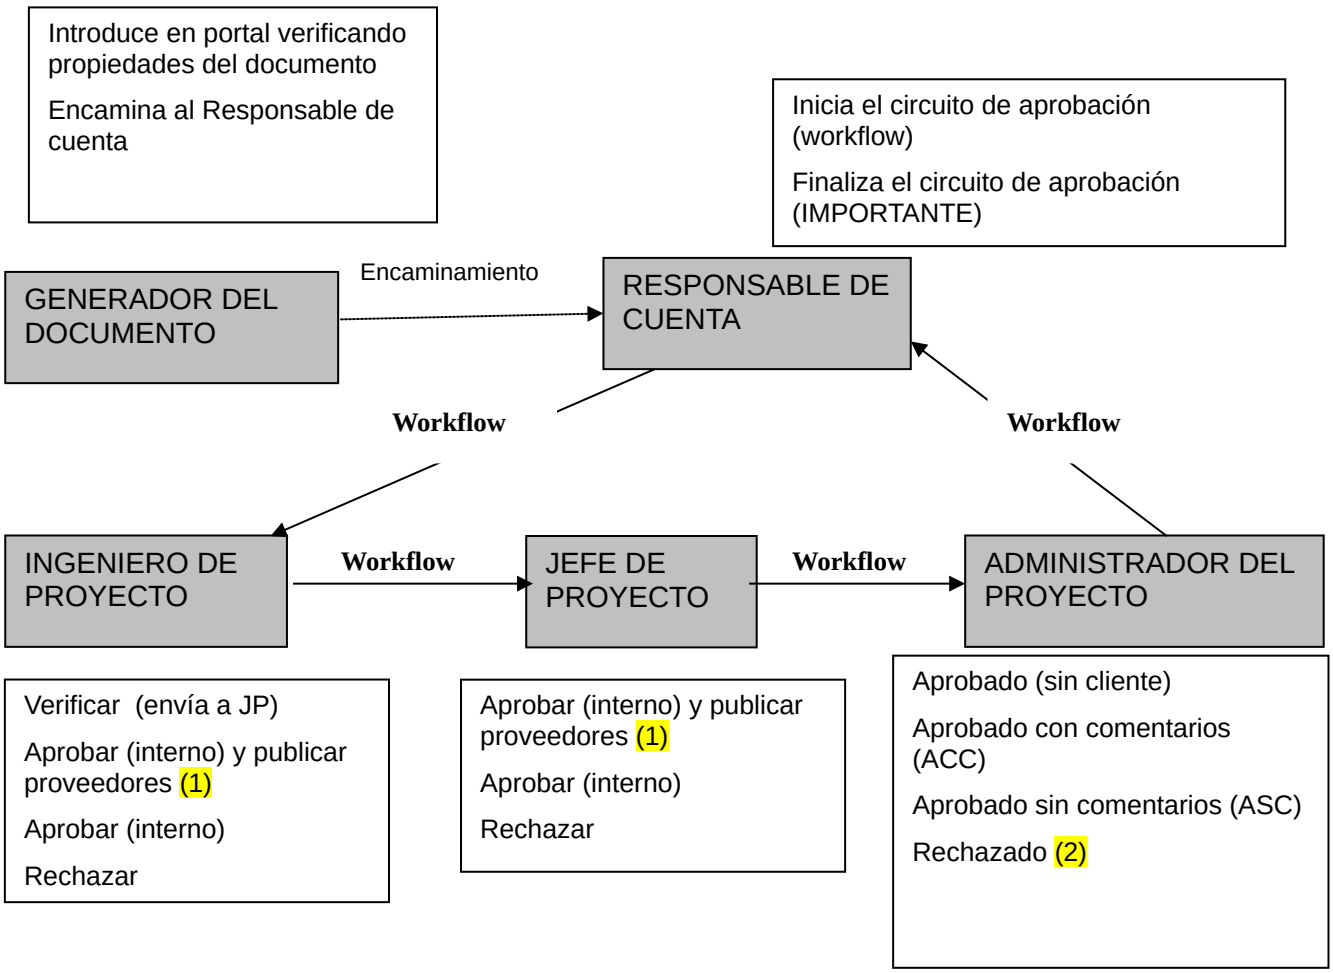

Tanto el Ing. de Proyecto como el Jefe de Proyecto pueden decidir si se publica el documento para que este accesible inmediatamente a los proveedores.
Finalmente el Administrador de Proyectos puede decidir la publicación o no del documento para que esté accesible a los proveedores

5. INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO EN EL PORTAL

Una vez es generado un documento para aprobación, el generador de dicho documento lo introduce en el Portal y lo hace llegar al responsable de cuenta correspondiente para que éste lo envíe para la aprobación de la dirección de proyecto y la posterior distribución por el administrador del proyecto.

ACCIONES	RESPONSABLE
1) Realización de las siguientes **comprobaciones previas** sobre el documento: - **Contiene** en las casillas de firma **las siglas de los firmantes** así como el **número**, la **fecha** y el **objeto de la edición.** - **El documento es imprimible**, es decir, si en ese momento decidiéramos imprimirlo, el contenido del documento se ajustaría al área de impresión. - **No contiene ni macros ni vínculos** (aplicable principalmente a documentos Excel).	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**
2) **CASO PARTICULAR:** si se trata de un **plano** en formato **dwg** ó **dgn** se creará **una versión PDF del documento (rendición PDF)** para su posterior introducción en el Portal **junto al documento en formato original como rendición del mismo.**	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**
3) **INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO AL PORTAL:** - **<u>CASO 1</u>: Se trata de la primera edición del documento** • **Localización de la carpeta apropiada** donde ubicar el documento. • **Importación del documento** en dicha carpeta.	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**

ACCIONES	RESPONSABLE
→ Acciones de la carpeta → Importar un documento • **Fijar las propiedades adecuadas (Ver Anexo 2).** → Fijar propiedades • **Importación para archivos .dgn, .dwg de una rendición PDF** del documento. No es necesario si el original es ya un PDF. → Acciones del documento → Importar como rendición • **Abrir el documento** incorporado **para comprobar que se visualiza correctamente. En el caso de planos** se verificará **tanto el formato original como la rendición.** - **CASO 2:** Se trata de una **nueva edición (el documento está en el portal en una edición anterior)** • **Localizar** el documento **en el Portal** • Incorporar el documento **superponiendo la nueva edición a la existente (check-out/check-in)** → Acciones del documento → Check-out → cerrar ventana → Check-in • **Modificar las propiedades que han variado** respecto a la edición anterior **(**en principio **número de edición, fecha** y **editado para). (Ver Anexo 2).** → Propiedades • Importar para archivos **.dgn, .dwg una rendición PDF** del documento. → Acciones del documento → Importar como rendición • Abrir el documento incorporado para **comprobar que se visualiza correctamente.** En el caso de planos se verificará	

ACCIONES	RESPONSABLE
tanto el formato original como la rendición.	
4) En el caso de que **el generador del documento no sea el responsable de cuenta,** envío del documento al responsable de cuenta correspondiente a través del portal mediante el **encaminamiento del documento (envío de una tarea).** Acciones del documento → Encaminar a usuarios seleccionados → seleccionar al responsable de cuenta correspondiente	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**
5) **CASO PARTICULAR:** en el caso de que se trate de la **primera edición del documento** y caso de que no lo haya hecho antes, **darlo de alta en el programa de control de documentos.**	**RESPONSABLE DE CUENTA**
6) Tras dar el visto bueno al documento recibido en forma de tarea**, el responsable de cuenta inicia el circuito de aprobación del documento (workflow)** de modo que el documento irá apareciendo sucesivamente como tarea a los implicados en la aprobación para que éstos lo aprueben o lo rechacen. Acciones del documento → Seleccionar workflow	**RESPONSABLE DE CUENTA**
7) **Aprobación o rechazo del documento** recibido en forma de tarea.	**DIRECCIÓN DE PROYECTO**
8) Si el **documento es aprobado,** como parte del circuito le llega una tarea al **administrador del proyecto** para que éste proceda a su **distribución.** Si el documento es **enviado al cliente para aprobación, mantiene la tarea; en cambio si no es así termina la tarea, finalizando así el workflow.**	**ADMINISTRADOR DEL PROYECTO**
9) **Actualización** en el programa **de control de documentos** de los **datos asociados al documento (edición, fecha, etc.).**	**ADMINISTRADOR DEL PROYECTO**
10) Edición del **transmittal** correspondiente, el cual es enviado **vía e-mail a todos aquellos a los que se debe distribuir el documento,** de modo que éstos se dan por enterados de que el documento está **disponible en el portal.**	**ADMINISTRADOR DEL PROYECTO**

En el caso de que se trate de un documento que requiera la **aprobación por el cliente**, una vez el **documento y/o los comentarios realizados son enviados por el cliente del modo habitual (en papel, vía e-mail, etc.)** se procede del siguiente modo:

11) **Finalización de la tarea** asociada al documento indicando **el estado** que el cliente ha fijado para el documento **(aprobado, aprobado con comentarios, etc.)** actualizando el registro del programa de **control de documentos.**	**ADMINISTRADOR DEL PROYECTO**
12) **La tarea no queda terminada** y por tanto el documento no queda **desligado del workflow hasta que es finalizado por el Responsable de Cuenta** que lo ha iniciado.	**RESPONSABLE DE CUENTA**

CASO PARTICULAR: DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS AL CLIENTE

A la hora de distribuir los documentos al **cliente el Administrador de Proyecto generará un único transmittal diario** en el que se recojan todos aquellos documentos aprobados por IUI durante el día.

Dicho **transmittal** le será enviado **al cliente a través de e-mail,** dándose éste por enterado de que dichos documentos se encuentran **disponibles en el Portal de Internet de IUI.**

ANEXO 1. **Auditoria**

Estado: Aprobado

Aprobado SC

Editado para: Construcción

Documento: 303-09-D-104

OT: 14113-CEPSA HDS V

Título: ESTRUCTURA PARA POLIPASTO REACTOR

Fecha de aprobación: 21/07/02

Edición: 03

Fecha de revisión Cliente: 29/07/02

Departamento: Mecánica

Descripción: Estructura para el polipasto de la plataforma superior del reactor

Histórico de estados del documento

Tipo	Fecha	Responsable	Acción	Cargo
PROYECTO	18/07/02	Carrasco García, Pedro	Envío a aprobación	Responsable de cuenta
	19/07/02	Del Coto Errasti, Antonio	Verificación	Ingeniero de Proyecto
	21/07/02	López Almansa, Salvador	Aprobación	Jefe de Proyecto
	29/07/02	López Villarejo, Luis	Registro de la situación	Administrador de Proyecto

ANEXO 2.

Propiedades

Tipo de documento: IUI_Documento_de_Proyecto

Atributos o propiedades del documento a rellenar durante la importación. También al introducir una nueva edición del documento habrá que tener en cuenta las propiedades que han cambiado y hay que actualizar.

Propiedad	Descripción	Ejemplo
DOCUMENTO *Máx 255 caracteres*	Número del documento.	E-G-01
TITULO *Máx 255 caracteres*	Título que aparece en el documento físico.	ESPECIFICACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS
EDICION *Máx 3 caracteres*	Número de la edición del documento.	01
FECHA *Máx 32 caracteres*	Fecha de la edición del documento físico. (Formato aconsejado: dd/mm/aaaa)	16/03/2002
EDITADO PARA Lista *desplegable*	El objeto para el cual se edita el documento	Aprobación y/o comentarios
AUTORES *Máx 32 caracteres por autor, separados por comas*	Nombre y apellidos del autor (en este orden), que puede ser distinto del usuario que introduce el documento en el portal	Agustín García
OT *Lista deplegable*	Designación del Proyecto	14113-CEPSA HDS V
DEPARTAMENTO *Lista deplegable*	Departamento al que pertenece el documento.	Mecánica
CLASE *Lista deplegable*	Clase de documento.	Especificación
ACTIVIDAD *Lista deplegable*	Actividad con la que está relacionada el documento	30 - EQUIPOS DINAMICOS
IDIOMA *Lista deplegable*	idioma en el que está escrito el documento. (Por defecto español)	Español
DESCRIPCION *Máx 255 caracteres*	. Es una descripción del contenido del documento	Especificación general del proyecto basada en la de CEPSA
PALABRAS CLAVE *Máx 32 caracteres por palabra o concepto, separados por comas*	Palabras que servirán para buscar y categorizar en el futuro el documento (palabras o conceptos separados por comas “,”)	Cierres mecánicos
