INSTRUCCIONES DE APROBACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE IUI PARA EL PROYECTO 16057 – PARS Irán

ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE
2. APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS
3. CIRCUITOS DE APROBACIÓN O WORKFLOWS DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO
4. INSTRUCCIONES
5. 5.
6. 5. DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN

ANEXO 1. Auditoría

ANEXO 2. Estructura de los circuitos de aprobación WORKFLOW

ANEXO 3. Propiedades del tipo documental: IUI_Documento_de_Proyecto

ANEXO 4. Comunicación diaria (TRANSMITTAL) de los documentos aprobados.

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
ALBR	CPA / AMM / JJDP	01	19/02/2003	PARA APROBACIÓN

1. OBJETO Y ALCANCE

Este documento tiene por objeto describir el procedimiento de **introducción**, **aprobación** y **distribución de documentos en el portal de IUI para el proyecto 16057 – PARS Irán.**

2. APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

El Portal de IUI permite establecer **circuitos de aprobación (workflows)** mediante los cuales se hacen llegar los documentos a aquellos destinatarios que deban verificarlos o aprobarlos.

Mediante estos circuitos de aprobación asignamos un **Ciclo de Vida** a los documentos que consiste en una sucesión de estados de aprobación. A medida que el workflow avanza el estado del documento va cambiando.

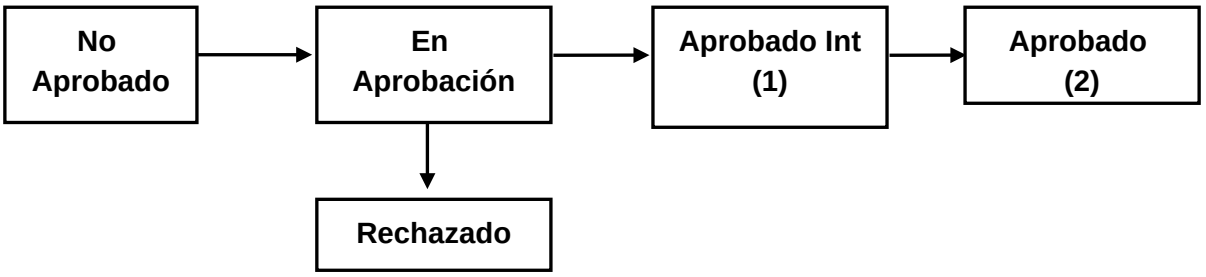

(1) Indica aprobación interna (por IUI).

(2) Indica que el documento se considera a todos los efectos APROBADO, tanto para la Ingeniería (IUI y sus socios) como para el cliente.

Cada acción de aprobación o rechazo exige la introducción de la **contraseña del usuario y queda registrada en el sistema** mediante un registro de auditoría (Ver ANEXO 1)

Mediante la aprobación electrónica de los documentos se persiguen los siguientes objetivos:

- **Control del estado y del proceso de aprobación de los documentos**: para cada documento siempre será posible conocer en qué estado se encuentra, es decir, si aún no está aprobado, si está aprobado internamente, si ya ha sido revisado por el cliente,

etc. Asimismo, las acciones de aprobación o rechazo quedan registradas en la auditoría de cada documento.

- **Integridad de la información:** una vez aprobado un documento no será posible borrarlo o sobrescribirlo pero sí introducir una nueva edición conservando las anteriores. Ello posibilita a su vez establecer permisos sobre el documento que permitan escribir a varios usuarios y por tanto la actualización de las nuevas ediciones por cualquiera de ellos.
- **Disponibilidad inmediata de la información**: el documento es introducido previamente a su aprobación con lo que cuando ésta se produce la distribución de los documentos y el acceso a los mismos son inmediatos.

MUY IMPORTANTE: dado que la aprobación electrónica está asociada a la introducción de la contraseña del usuario, es REQUISITO DE SEGURIDAD que cada usuario sea el único que conozca su contraseña, no debiendo darla a conocer a ningún otro.

3. CIRCUITOS DE APROBACIÓN O WORKFLOWS DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO

Se emplearán dos WORKFLOWS (circuitos de aprobación) (Ver Figura Adjunta)**:**

- Uno específico para **RM (Requisiciones de Material)**
- Otro general **para el resto de los documentos que requieran aprobación**,

Dichos WORKFLOWS (circuitos de aprobación) serán **siempre iniciados** por el **Responsable de Cuenta** correspondiente, siendo éste el único con opción a ello. A partir de aquí, **se recorre el circuito completo** (dirección de proyecto, Administrador de proyecto)

La única diferencia entre ambos circuitos es que **el workflow específico para las RMs incluye un paso adicional**.

Las **RMs** constituyen la **especificación técnica** de un determinado **suministro** de equipos o materiales que es enviada a los proveedores tanto para petición de oferta como para compra (como un documento contractual del pedido).

Se trata de un **documento compuesto por la propia RM y por una serie de adjuntos** que en ella se citan. Para que todos los documentos asociados a la RM sean **accesibles por los proveedores** vía Internet**, es preciso agrupar todos ellos en una misma carpeta**.

El encargado de agruparlos es el Administrador de Proyecto, **de ahí que en el workflow exista un paso previo** a los pasos de aprobación a través del cual el administrador recibe las RMs para las cuales debe realizar dicho agrupamiento.

Al diferenciar los circuitos de aprobación damos especial importancia a los documentos de Requisición de Materiales (RM) que contarán con un participante más en el circuito de aprobación. Las RMs, además del documento propiamente dicho, tienen una serie de documentos adjuntos que forman parte del diseño de la RM; estos documentos tienen que estar previamente revisados por el Administrador de Proyecto (su incorporación en el portal así como sus propiedades: fecha, edición,...) y enlazados en la estructura matricial de las RMs para su aprobación completa (el documento de la RM y todos los documentos adjuntos a ella) antes de su salida a través del Portal de Comercio Electrónico (Centro de Negocios) de IUI.

El **acceso** por parte de los **proveedores** a los documentos asociados a las RMs **incorporados a la Base Documental seráestá controlado por el funcionamiento normal delpropio circuito de aprobación**, de manera que **en el momento de la aprobación interna, la dirección de IUI puede decidir si los documentos se publican** en el Centro de Negocios (Portal de Comercio Electrónico de IUI) **o no quedan accesibles hasta que el cliente los aprueba**. (Ver la estructura del circuito de aprobación WORKFLOW)

4. INSTRUCCIONES

Vamos a ver un desarrollo de los pasos o acciones así como las personas implicadas en el desarrollo general de un WORKFLOW en el proyecto 16057 PARS Irán.

ACCIONES	RESPONSABLE
1) Realización de las siguientes **comprobaciones previas** sobre el contenido del documento:	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**

ACCIONES	RESPONSABLE
- **Contiene** el **número**, la **fecha** , el **objeto de la edición** y **los nombres de los firmantes (L.Perez).** - **El documento es imprimible**, es decir, si en ese momento decidiéramos imprimirlo, el contenido del documento se ajustaría al área de impresión. - **No contiene ni macros ni vínculos** (aplicable principalmente a documentos Excel).	
2) **CASO PARTICULAR:** si se trata de un **plano** en formato **dwg** ó **dgn** se creará **una versión PDF del documento (rendición PDF) para su posterior introducción en el Portal** junto al documento en formato original (como rendición del mismo).	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**
3) **INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO AL PORTAL:** **(** Manual **MN-GC-I-02. ACCIONES BÁSICAS** editado por Gestión del Conocimiento **)** - **CASO 1: Se trata de la primera edición del documento** • **Localización de la carpeta apropiada** donde ubicar el documento. • **Importación del documento** en dicha carpeta. • **Cumplimentación adecuada de las propiedades (ANEXO 3)** • **Importación (dwg** ó **dgn) o creación (otros formatos) de la rendición PDF** - **CASO 2:** Se trata de una **nueva edición (el documento está en el portal en una edición anterior)** • **Localización del documento en el portal** • **Inclusión del documento como una nueva versión sobre la existente** (check-out / check-in) • **Cumplimentación adecuada de las propiedades (ANEXO 3)** • **Importación (dwg** ó **dgn) o creación (otros formatos) de la rendición PDF**	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**

ACCIONES	RESPONSABLE
4) **Comunicación** al Responsable de Cuenta **que el documento se encuentra disponible en el portal para ser enviado para aprobación** *(se recomienda para ello emplear la opción **"encaminar"** del portal)*	**GENERADOR DEL DOCUMENTO**
5) **5) Verificación del documento** para comprobar que está listo para iniciar el circuito de aprobación.	**RESPONSABLE DE CUENTA**
6) **Lanzamiento del WORKFLOW,** eligiendo uno u otro en función de si el documento es o no una RM	**RESPONSABLE DE CUENTA**
7) ***Caso particular de RMs (REQUISICIONES DE MATERIAL):*** **-** Crear la estructura de carpetas de la RM **- Enlazar** la lista de documentos adjuntos de la RM **(** ver manual **MN-GC-I-08. GUÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA ADMINISTRADORES DE PROYECTO)**	**ADMINISTRADOR DE PROYECTO**
8) **Aprobación:** Cualquiera de los integrantes de la **Dirección de Proyecto de IUI** (Jefe de Proyecto o Ingenieros de Proyecto) tendrá cuatro opciones: • **Aprobar internamente** El documento queda aprobado internamente a la espera de la revisión del cliente (en este momento el documento sigue sin ser accesible a los proveedores). • **Aprobar internamente y publicar BC:** El documento queda aprobado internamente a la espera de la revisión del cliente pero ya es accesible por los proveedores. • **Aprobar :** para documentos que no necesiten aprobación por el cliente, la dirección de proyecto selecciona esta opción para, a todos los efectos, dejar el documento como aprobado. • **Rechazar:** Si el documento es rechazado finaliza el circuito para así proceder a la corrección del mismo. Existe un **buzón común de tareas** al que los integrantes de la Dirección de Proyecto de IUI tendrán acceso. Una vez abran una de las tareas, **aunque no la aprueben,** se eliminará del buzón común pasando al propio. Existe, por tanto, la posibilidad de **REASIGNAR la tarea al otro componente de la Dirección** si	**DIRECCIÓN DE PROYECTO IUI**

ACCIONES	RESPONSABLE
una vez abierta consideran que debe ser ese integrante el que apruebe el documento.	
9) Revisión del cliente. El resultado de la aprobación por el cliente es registrado por el Administrador de Proyecto una vez recibido el documento del cliente (L-OT-CM-ZZZ). Elegirá entre una de las siguientes opciones: • **Aprobado Sin Comentarios (ASC)** • **Aprobado Con Comentarios (ACC)** **(IMPORTANTE:** Los **comentarios no son incorporados** al documento electrónico) • **Rechazado**.	**ADMINISTRADOR DE PROYECTO**

Para un control de plazos (tiempo) en la aprobación se han implementado una serie de avisos automáticos: Notificaciones :

- **Al Responsable de Cuenta:**
  - **si Jefe de Proyecto se demora 5 días en la aprobación de cualquier documento (general o RM, de los dos circuitos)**
  - **si Administrador de Proyecto se demora 2 días al enlazar la RM (circuito específico para RMs (RM))**
  - **si el Cliente se demora 5 días en la aprobación de cualquier documento. (general o RM, de los dos circuitos)**

Además de estas notificaciones al Responsable de Cuenta le llegará también al participante del WORKFLOW que esté reteniendo la tarea de aprobación.

Si un documento se encuentra en un circuito de aprobación, no es posible introducir una nueva edición del mismo.

Por ello, **SÓLO EN EL CASO EXCEPCIONAL de que un documento está pendiente de la respuesta del cliente y se da la necesidad de introducir una nueva edición, el responsable de cuenta podrá finalizar el workflow,** ejecutando para ello una tarea de finalización que tendrá disponible en su buzón de tareas.

5. DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA DOCUMENTACIÓN

Mediante el **estado de aprobación** y la **fecha de aprobación** de los documentos **es posible detectar automáticamente qué documentos están listos para ser distribuidos** y a qué participantes.

Así para realizar la **distribución**, el **administrador de proyecto diariamente procede del siguiente modo:**

- **Obtiene la lista de documentos a distribuir** ordenada por actividad y clase (ver Anexo 3), utilizando como criterio para ello el estado y fecha de aprobación (seleccionaría aquellos cuya fecha de aprobación es igual o mayor que la de hoy).
- **La distribución consistiría en el envío de dicha lista por email** (a modo de transmittal interno) a los distintos participantes del proyecto, dándose éstos por enterados de la disponibilidad de los documentos listados en el portal de IUI.

En el Anexo 4 se recoge un ejemplo del formato de la lista de envío.

ANEXO 1. **Auditoria**

Estado: Aprobado

Aprobado SC

Editado para: Petición de Oferta

Documento: **REQ-102-EQ-F00-0**	**OT:** 16057 – PARS Irán
Título STORAGE SPHERES	**Fecha de aprobación:** 08/02/03
Edición: 00	**Fecha de revisión Cliente:** 14/02/03
Departamento: Mecánica	
Descripción: Requisición de Esferas	

Histórico de estados del documento

Tipo	Fecha	Responsable	Acción	Cargo
PROYECTO	07/02/03	Cámara Cámara, Sonia	Envío a aprobación	Responsable de cuenta
	08/02/03	Brignardello, Aldo	Aprobación	Jefe de Proyecto IUI
	14/02/03	López Rubio, Verónica	Registro aprobación Aprobado SC	Administración Proyecto

ANEXO 2. Estructura de los circuitos de aprobación WORKFLOW

Circuito 1. Aprobación general de documentos

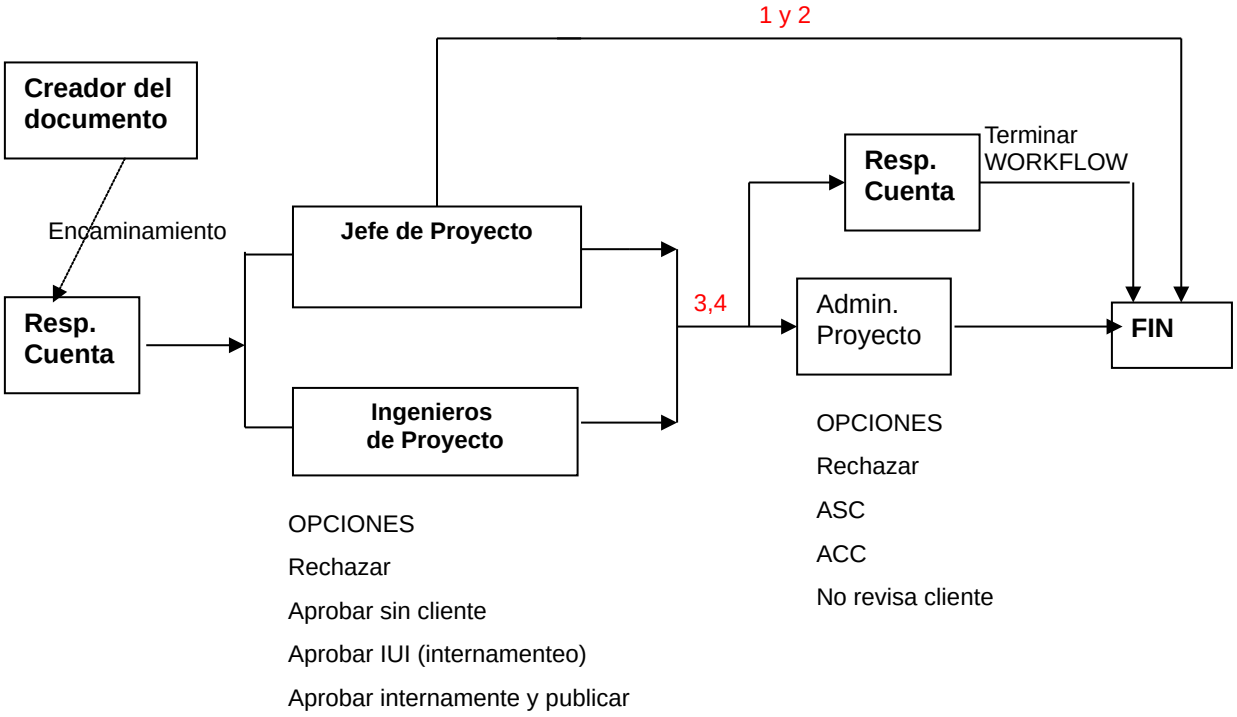

Circuito 2. Aprobación de las RMs (RM: REQUISICIÓN DE MATERIAL).

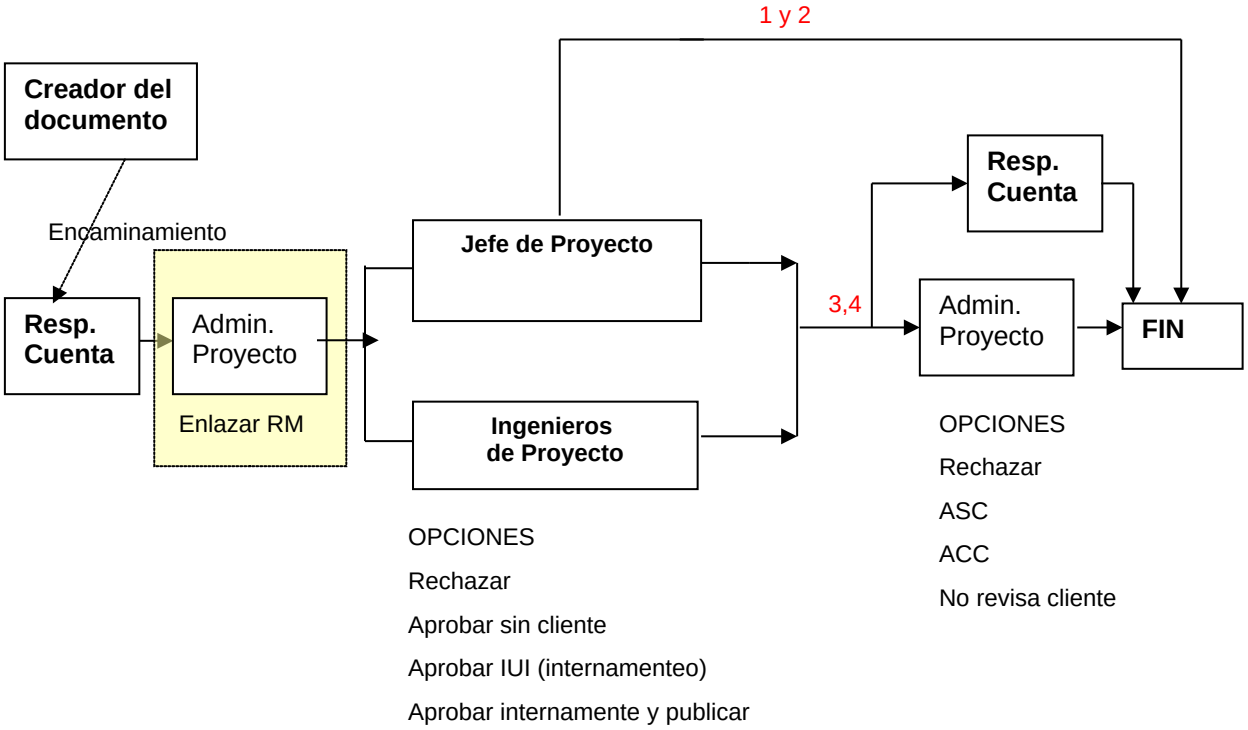

<u>ANEXO 3. Propiedades del tipo documental:</u> IUI_Documento_de_Proyecto

Atributos o propiedades del documento a rellenar durante la importación. También al introducir una nueva edición del documento habrá que tener en cuenta las propiedades que han cambiado y hay que actualizar (SOMBREADAS).

Propiedad	Descripción	Ejemplo
DOCUMENTO *Máx 255 caracteres*	Número del documento.	**REQ-102-EQ-F00-0**
TITULO *Máx 255 caracteres*	Título que aparece en el documento físico.	**STORAGE SPHERES**
EDICION *Máx 3 caracteres*	Número de la edición del documento.	**00**
FECHA *Máx 32 caracteres*	Fecha de la edición del documento físico. (Formato aconsejado: dd/mm/aaaa)	07/02/2003
EDITADO PARA Lista *desplegable*	El objeto para el cual se edita el documento	**Petición de Oferta**
AUTORES *Máx 32 caracteres por autor, separados por comas*	Nombre y apellidos del autor (en este orden), que puede ser distinto del usuario que introduce el documento en el portal	**Sonia Cámara Cámara**
OT *Lista deplegable*	Designación del Proyecto	**16057-PARS Irán**
DEPARTAMENTO *Lista deplegable*	Departamento al que pertenece el documento.	**Mecánica**
CLASE *Lista deplegable*	Clase de documento.	**RM / RC**
ACTIVIDAD *Lista deplegable*	Actividad con la que está relacionada el documento	**30 - EQUIPOS ESTÁTICOS**
IDIOMA *Lista deplegable*	idioma en el que está escrito el documento. (Por defecto español)	**Inglés**
DESCRIPCION *Máx 255 caracteres*	. Es una descripción del contenido del documento	**Requisición de Esferas**
PALABRAS CLAVE *Máx 32 caracteres por palabra o concepto, separados por comas*	Palabras que servirán para buscar y categorizar en el futuro el documento (palabras o conceptos separados por comas “,”)	**esferas**

<u>ANEXO 4.</u> Comunicación diaria (TRANSMITTAL interno) de los documentos aprobados.

INTECSA UHDE	DOCUMENTOS INCORPORADOS AL PORTAL				PROYECT0	16057 - PARS Irán
					CLIENTE	PARS Petrochemical co.
					TRANSMITTAL	2
					FECHA	10/02/2003
					EDITADO POR	Juan José Díez Peña
Actividad	Clase	ID documento	Descripción	Rev	Editado para	Fecha de Edición
00 - GENERAL	Especificación	16057-IT-01	PROCEDIMIENTO DE USO DEL PORTAL EN EL PROYECTO 16057 - PARS Irán	1	Aprobación y/o comentarios	03/12/2002
00 - GENERAL	Especificación	16057-IT-01 (I)	PORTAL USE PROCEDURE - 16057 PARS Irán PROJECT	1	Aprobación y/o comentarios	03/12/2002
00 - GENERAL	General	NUMBERING & CODING SYSTEM		0	Aprobación y/o comentarios	18/12/2002
32 - EQUIPOS ESTATICOS	Planos de Equipo	DWG-EQ-30-1001	PROPYLENE SPHERE- 60-D-3040	A	Aprobación y/o comentarios	05/02/2003
32 - EQUIPOS ESTATICOS	Planos de Equipo	DWG-EQ-30-1002	PROPYLENE SPHERE DETAILS - 60-D-3040	A	Aprobación y/o comentarios	05/02/2003
32 - EQUIPOS ESTATICOS	Planos de Equipo	DWG-EQ-30-1005	PROPANE SPHERE - 60-D-3030	A	Aprobación y/o comentarios	05/02/2003
32 - EQUIPOS ESTATICOS	Planos de Equipo	DWG-EQ-30-1006	PROPANE SPHERE DETAILS - 60-D-3030	A	Aprobación y/o comentarios	05/02/2003
40 - ELECTRICIDAD	Especificación	E-N-08	MOTORES ELÉCTRICOS DE INDUCCIÓN	2		01/07/2000
50 - INSTRUMENTACION	Especificación	EC-K-21	ESPECIFICACIÓN GENERAL DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS	3		01/11/1998
