CONTROL DE SOBRE FACTURACIÓN EN PEDIDOS Y SUBCONTRATOS

RLLP	OMP/DGB	ACM	1	Junio 20	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO.....3

2. ALCANCE.....3

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.....4

3.1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.....4

3.2. DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTOS.....4

3.3. DEPARTAMENTO DE SUBCONTRATOS / ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS.....5

3.4. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS.....5

3.5. DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS.....6

3.6. DEPARTAMENTO DE IT.....6

4. CONTROL DE SOBRE FACTURACIÓN.....6

ANEXO I. FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN DE FACTURAS.....8

1. OBJETO

El propósito de este procedimiento es establecer las funciones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas en la gestión y control de la facturación de nuestros Proveedores y Subcontratistas, a lo largo de la vida del proyecto, para evitar que puedan sobre facturar y por tanto, que se pueda pagar por encima del valor oficial del pedido o subcontrato.

Las herramientas utilizadas en la facturación (NAVISION y aplicación interna de facturas) aunque permiten el registro de la factura en el sistema, en caso de que la factura suponga un sobre facturado, no permiten que sea aprobada por el nivel 1 del circuito de firmas.

2. ALCANCE

El procedimiento afecta a:

- Pedidos de Aprovisionamientos: El valor de referencia para limitar el sobre facturado será siempre el sumatorio del pedido original y de los distintos suplementos que se generen.
- Subcontratos de Construcción: Dada la naturaleza de los subcontratos, basados en unas cantidades estimadas y unos precios unitarios y que el valor estimado del mismo es cambiante (en función del grado de avance de diseño, modificaciones que pudieran realizarse en obra y otros conceptos) y que no tiene siempre por qué regularizarse oficialmente a través de una adenda, para analizar si el subcontrato está sobre facturado o no, además del valor del subcontrato (valor original más adendas realizadas, si éstas existieran), se incluirá un segundo valor de referencia estimado por el Dpto. de Control de Proyectos y que será el coste final esperado del subcontrato incluido en el control de costes del Proyecto. En caso de que los registros de ambos valores estén rellenos, prevalecerá el valor del Coste final esperado.

El tratamiento definido para pedidos y subcontratos será extensible a las LMRs y subcontratos locales.

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada uno de los Departamentos involucrados en la facturación.

3.1. Departamento de Administración

- Verificar que la factura recibida del Proveedor / Subcontratista incluye toda la información necesaria y es correcta: Nº de proyecto, Nº de pedido / Nº subcontrato, Nº de factura, fecha e importe.
- Registrar la factura en la OT correspondiente, con el número del pedido oficial, y sin añadir nomenclatura alguna para reflejar los suplementos / adendas, en su caso. Si el Proyecto tuviera un desglose de OTs por monedas, las facturas deberán ser registradas de acuerdo a ellas.
- Tener actualizados los valores de los Pedidos y Subcontratos de acuerdo a los suplementos que se realicen, para evitar falsos sobre facturados.

Para el adecuado funcionamiento del sistema, y la correcta identificación de una posible sobre facturación, es necesario que se cumplan de forma precisa los requisitos anteriores.

3.2. Departamento de Aprovisionamientos

- Tan pronto se firme un pedido o un suplemento de pedido deberá ser distribuido al Dpto. de Administración para que el valor del pedido en su base de datos esté siempre actualizado.
- En los circuitos de firmas, donde a Aprovisionamientos le corresponde el nivel 1 (de aprobación) y en el caso de que no pueda aprobar una factura (aun cuando la factura sea correcta) porque el valor de facturación supere el valor del pedido, deberá contactar con el Dpto. de Administración para resolver el motivo que ha

generado este impedimento (valor del pedido no actualizado con suplementos u otros).

- Los pedidos “locales” / LMRs tienen el mismo tratamiento.

3.3. Departamento de Subcontratos / Administración de Subcontratos

- Tan pronto se firme un subcontrato o una adenda al subcontrato deberá ser distribuido al Dpto. de Administración para que el valor del subcontrato en su base de datos esté siempre actualizado.
- En los circuitos de firmas donde a Subcontratos / Administración de Subcontratos le corresponda el Nivel 1 del circuito de aprobación, y en el caso de que no pueda aprobar una factura (aun cuando la factura sea correcta), el sistema devolverá un mensaje indicando si la sobre facturación está marcada por el valor del subcontrato, y por tanto deberá contactar con el Dpto. de Administración para resolver el motivo que ha generado este impedimento (valor en base de datos no incluye alguna adenda u otro motivo), o si por el contrario la sobre facturación está marcada por la comparación con el coste final esperado, incluido en el control de costes del Proyecto y en cuyo caso tendrán que contactar con el Dpto. de Control de Proyectos para resolver el motivo que ha generado este impedimento.
- El tratamiento de los subcontratos “locales” (alquileres de grúas, maquinarias, andamios, etc.) está sujeto al mismo tratamiento.

3.4. Departamento de Control de Proyectos

- Incluirá el segundo valor de referencia que es el coste final esperado del subcontrato considerado en el Control de Costes del Proyecto. Servirá de valor limitante a la hora de restringir la aprobación de una factura. Será responsabilidad del Departamento de Control de Proyectos (Control de Costes) actualizar esta cifra con la periodicidad que sea requerida para evitar que se produzcan falsos sobre facturados.
- En los circuitos de firmas donde a Control de Costes / Control de Proyectos le corresponde el nivel 1 de aprobación, y en el caso de que no pueda aprobar una factura (aun cuando la factura sea correcta), porque el valor de facturación supere el valor del subcontrato, el sistema devuelve un mensaje indicando si la sobre facturación está marcada por el valor del subcontrato, y por tanto deberá contactar con el Dpto. de Administración para resolver el motivo que ha generado este

impedimento (valor en base de datos no incluye alguna adenda u otro motivo), o si por el contrario la sobre facturación está marcada por la comparación con el coste final esperado incluido en el control de costes del Proyecto, y en cuyo caso procederán a revisarlo.

3.5. Departamento de Dirección de Proyectos

- Participará en la medida que sea requerido en la resolución, dentro de cualquier proyecto, de las particularidades que pudieran darse.

3.6. Departamento de IT

- Tendrá actualizadas las herramientas para permitir el control propuesto y realizar las modificaciones que sean necesarias para ir adaptándolas a las nuevas casuísticas que pudieran darse.

4. CONTROL DE SOBRE FACTURACIÓN

Las facturas recibidas en el Dpto. de Administración deben ser siempre registradas en NAVISION y evitar de esta forma que sean extraviadas.

Una vez registradas, se incorporan al circuito de firmas en el Nivel 1, donde el sistema muestra el valor resultante de la suma de la factura a aprobar, junto al valor del resto de facturas del mismo pedido en el circuito de firmas (en nivel 2 y posteriores) y junto a las facturas ya contabilizadas (han sido aprobadas en el circuito de firmas). Es posible que en el nivel 1 haya varias facturas para aprobación del mismo pedido y que en su conjunto suponga un sobre facturado, pero en el análisis individual no y por tanto se permita su aprobación, ya que el valor mostrado sólo incluye la factura en aprobación.

En función del resultado mostrado por el sistema se dan dos posibilidades:

- Si el valor es inferior al valor de referencia del pedido o subcontrato / Coste final esperado (no sobre facturado), quedará a disposición de análisis del firmador en Nivel 1 para su aprobación o rechazo.
- Si el valor es superior al valor de referencia del pedido o subcontrato / Coste final esperado (sobre facturado), el firmador en Nivel 1 podrá rechazar pero nunca aprobar.

En caso de querer aprobar, será necesario que el Nivel 1 contacte con el Dpto. correspondiente (ya sea el de Administración o Control de Proyectos), en función del mensaje que reciba del sistema, para ver cuál es la causa por la que el pedido / subcontrato está sobre facturado, y en función del motivo se actuará en consecuencia.

Se pueden dar los siguientes casos:

- Que el Dpto. de Administración no haya recibido un pedido / suplemento de pedido o un subcontrato / adenda del subcontrato y por tanto el Dpto. De Aprovisionamientos o de Subcontratos, según corresponda, le enviará el documento para que puedan actualizar el valor en su base de datos. Una vez actualizado el mismo, la factura ya quedaría disponible para aprobación del Nivel 1 si así lo decidiera.
- Que el coste final esperado fijado por Control de Costes no esté actualizado y deba hacerse. La acción será resuelta por el Dpto. de Control de Proyectos. Una vez actualizado el valor, la factura ya quedaría disponible para aprobación del Nivel 1 si así lo decidiera.
- Que fuera necesario regularizar por parte del Dpto. de Aprovisionamientos o Subcontratos el pedido o subcontrato porque la factura corresponde a un alcance adicional que no estaba regularizado en pedido / suplemento / subcontrato / adenda subcontrato. Una vez regularizado deberá ser enviado al Dpto. de Administración para que puedan actualizar el valor en su base de datos. Una vez actualizado, la factura ya quedaría disponible para aprobación del Nivel 1 si así lo decidiera.

En el caso de que el Nivel 1 rechazara la factura, será devuelta al Proveedor / Subcontratista.

ANEXO I. FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN DE FACTURAS

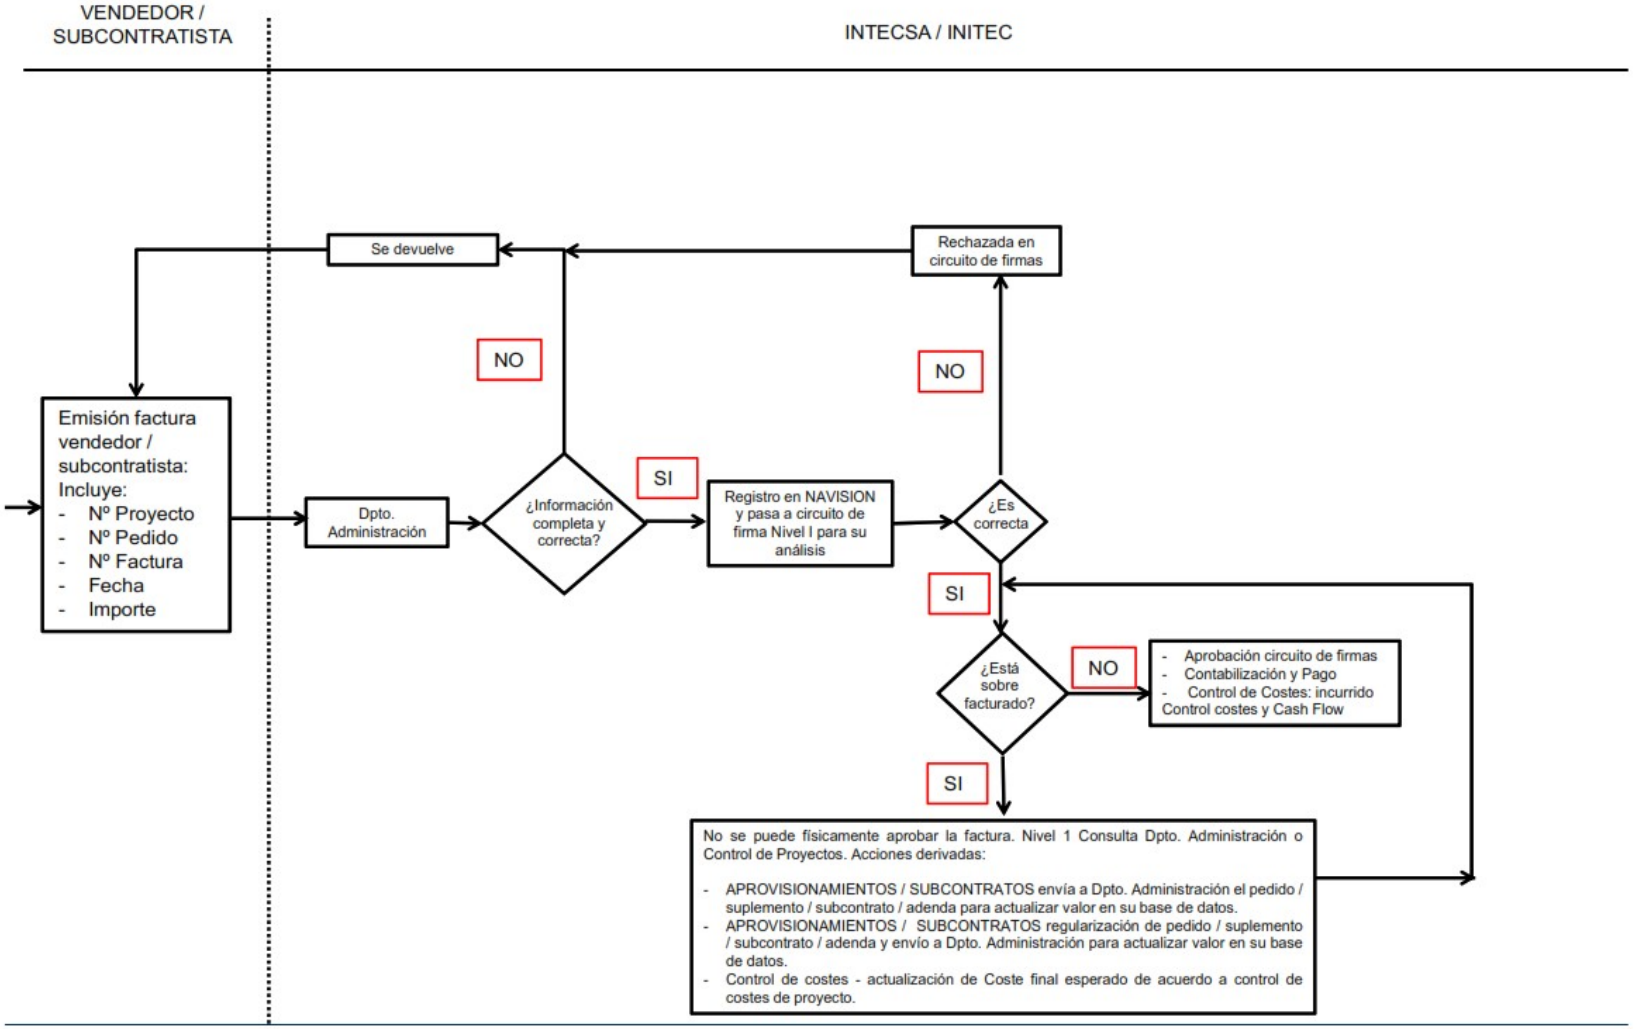
VENDEDOR / SUBCONTRATISTA
INTECSA / INITEC
Emisión factura vendedor / subcontratista: Incluye:
- Nº Proyecto
- Nº Pedido
- Nº Factura
- Fecha
- Importe
Dpto. Administración
¿Información completa y correcta?
NO
Se devuelve
SI
Registro en NAVISION y pasa a circuito de firma Nivel I para su análisis
¿Es correcta
NO
Rechazada en circuito de firmas
SI
¿Está sobre facturado?
NO
- Aprobación circuito de firmas
- Contabilización y Pago
- Control de Costes: incurrido Control costes y Cash Flow
SI
No se puede físicamente aprobar la factura. Nivel 1 Consulta Dpto. Administración o Control de Proyectos. Acciones derivadas:
- APROVISIONAMIENTOS / SUBCONTRATOS envía a Dpto. Administración el pedido / suplemento / subcontrato / adenda para actualizar valor en su base de datos.
- APROVISIONAMIENTOS / SUBCONTRATOS regularización de pedido / suplemento / subcontrato / adenda y envío a Dpto. Administración para actualizar valor en su base de datos.
- Control de costes - actualización de Coste final esperado de acuerdo a control de costes de proyecto.
